



工事写真帳 (1) 事業 撮影例 および 工事看板 表記例


事業① ばっ気用ブロワ2台の更新 (2台設置中の2台)


(工事前)既設機器設置状況	
	撮影日
	令和8年8月18日
	メーカー・型式
	西海 ID-80S
	台数
2台	

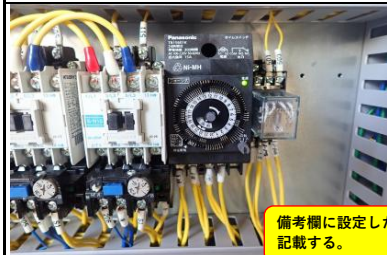
既設機器および新設機器 対照	
	撮影日
	令和8年8月18日
	メーカー・型式・台数
	(左) 新設 西海 ID-80S 2台
	(右) 既設西海 ID-80S 2台
備考	

(工事後)新設機器設置状況	
	撮影日
	令和8年8月18日
	メーカー・型式
	西海 ID-80S
	台数
2台	

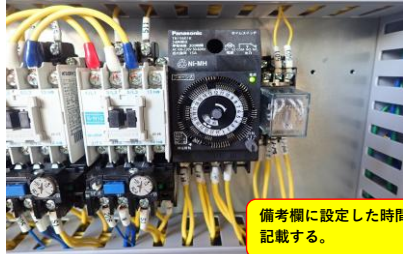
事業② 新設タイマーによる新設ばっ気ブロワ2台の運転時間の調整

(工事前)制御盤内部状況	
	撮影日
	令和8年8月18日
	メーカー・型式
	タイマー ピノ TS24L
	設置前
台数	
1台	

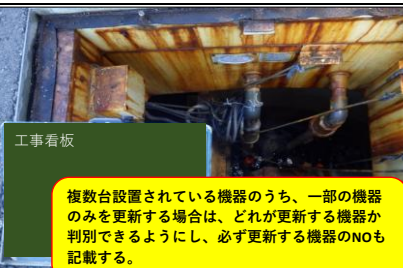
新設タイマー設置状況	
	撮影日
	令和8年8月18日
	メーカー・型式
	タイマー ピノ TS24L
	設置後
台数	
1台	


新設タイマー設定後	
	撮影日
	令和8年8月18日
	メーカー・型式
	タイマー ピノ TS24L
	台数 1台
備考	
設定時間 16時間/日 入り 8時間/台・日×2台	

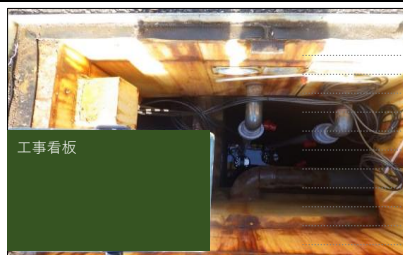
事業③ 既設調整ブロワ1台の既設タイマーによる運転時間の調整

既設タイマー設定変更後	
	撮影日
	令和8年8月22日
	メーカー・型式
	タイマー ピノ TS24
	台数 1台
備考	
設定時間 12時間/日 入り	

事業④ 放流ポンプ1台の更新 (2台設置中の1台)

(工事前)既設機器設置状況	
	撮影日
	令和8年8月18日
	メーカー・型式・台数
	コバラ 40ET-5.25
	2台設置の内1台更新予定
備考	
右側が更新するNo.1ポンプ	

既設機器および新設機器 対照	
	撮影日
	令和8年8月20日
	メーカー・型式・台数
	(手前) 新設コバラ40ET-5.25 1台
	(奥) 既設コバラ 40ET-5.25 1台
備考	
No.1ポンプ	

(工事後)新設機器設置状況	
	撮影日
	令和8年8月20日
	メーカー・型式・台数
	コバラ 40ET-5.25
	2台設置の内1台更新
備考	
右側が更新したNo.1ポンプ	

工事看板の表記例 (サイズ不問)

工事件名	令和8年度 浄化槽システムの脱炭素化推進事業
補助事業者	株式会社 全浄連
工事場所	株式会社全浄連 中野支店
撮影日	令和8年 8月 18日
	ばっ気ブロワ 2台 交換 交換前 既設ブロワ2台設置
施工者	全国浄化槽サービス株式会社

看板の工事場所は、別紙1実施報告書に記載された施設の名称とする。施工者は別紙1に記載された工事請負業者とする。
